

Liebe Bürger:innen,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) erneuert die Fahrbahndecke in der Barmbeker Straße zwischen Buchenstraße und Barmbeker Straßenbrücke (Goldbekkanal). Über den genauen Bauablauf möchten wir Sie hiermit gern informieren.

Was wird gebaut und warum?

Die Fahrbahn der Barmbeker Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, ist schadhaft und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an die täglichen Verkehrsmengen. Um einen weiteren Substanzverlust zu vermeiden und die Verkehrssicherheit weiterhin gewährleisten zu können, muss die Fahrbahndeckenschicht von der Buchenstraße bis zur Barmbeker Straßenbrücke (Goldbekkanal) erneuert werden. Auch die zwei Bushaltestellen Maria-Louisen-Straße (Nord) einschließlich der angrenzenden Geh- und Radwege werden erneuert.

Wann wird gebaut?

Die Erneuerung der Fahrbahndecke erfolgt im Zeitraum vom **29. Juli 2024 bis voraussichtlich 1. November 2024**. Die Arbeiten werden abschnittsweise in mehreren Bauphasen teils zeitlich überschneidend ausgeführt, um die Beeinträchtigungen räumlich und zeitlich zu begrenzen. Die Arbeiten wurden so koordiniert und eingetaktet, dass ein Großteil in den verkehrsärmeren Sommer- und Herbstferien ausgeführt wird, zum Teil auch an Wochenenden. Die genaue Abfolge der verschiedenen Phasen ist weiter unten beschrieben.

Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?

Die Ausführung der Sanierungsarbeiten erfolgt in folgenden räumlichen Abschnitten:

- Abschnitt A** Fahrbahnbereich zwischen Buchenstraße bis westlich Maria-Louisen-Straße
- Abschnitt B** Fahrbahnbereich im Kreuzungsbereich Barmbeker Straße / Maria-Louisen-Straße
- Abschnitt C** Fahrbahnbereich östlich Maria-Louisen-Straße bis einschließlich Kreuzung Barmbeker Straße / Wiesendamm / Krohnskamp
- Abschnitt D** Fahrbahnbereich östlich Kreuzung Barmbeker Straße / Wiesendamm / Krohnskamp bis Barmbeker Straßenbrücke (Goldbekkanal)
- Abschnitt X** Bushaltestellen Maria-Louisen-Straße (Nord)

Um Vollsperrungen der jeweiligen Abschnitte zu vermeiden, werden die Bauphasen in mehrere Baufelder/Teilbauphasen in Längsrichtung unterteilt. So wird gewährleistet, dass während der Bauzeit der Verkehr auf der Barmbeker Straße jederzeit aufrechterhalten werden kann. Die Abarbeitung der Bauphasen erfolgt nicht in alphabetischer Reihenfolge und es kann hinsichtlich der genauen Daten aufgrund unvorhergesehener Umstände und Anpassungen im Bauablauf zu Veränderungen kommen.

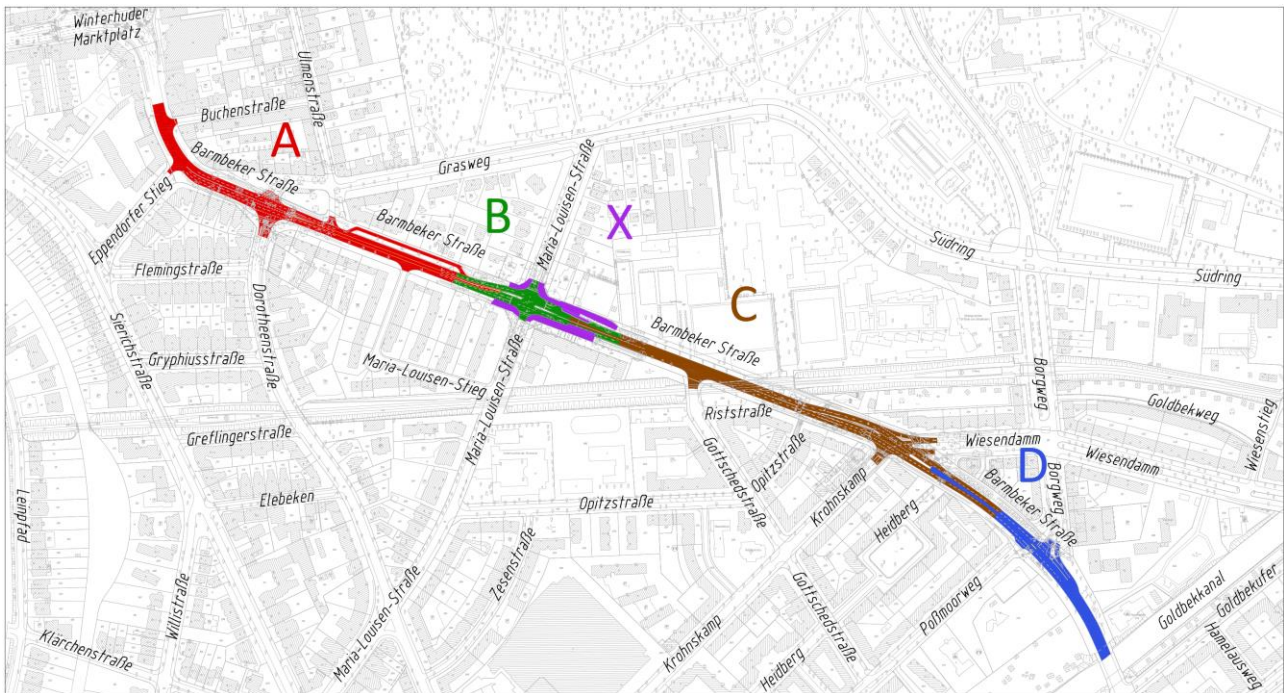


Abbildung 1: Lageplan Barmbeker Straße © Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung

Bauabschnitt A (September 2024)

Die Fahrbahn zwischen Buchenstraße und westlich der Maria-Louisen-Straße wird in drei Teilabschnitten saniert:

Bauphase A Nord (Freitag, 06.09.24 bis einschl. Donnerstag, 12.09.24)

Die zwei nördlichen Fahrstreifen werden saniert.
Die Einmündungen Buchenstraße, Ulmenstraße und Grasweg werden gesperrt.

Bauphase A Süd (Donnerstag, 12.09.24 bis einschl. Donnerstag, 19.09.24)

Die zwei südlichen Fahrstreifen werden saniert.
Die Einmündungen Eppendorfer Stieg, Dorotheenstraße und Maria-Louisen-Steig werden gesperrt.
Die Arbeiten der finden unmittelbar im Anschluss an die Bauphase A Nord statt.

Bauphase A Mitte (Donnerstag, 19.09.24 bis einschl. Mittwoch, 25.09.24)

Die Fahrbahnen in Straßenmitte der Barmbeker Straße werden saniert.
Die Arbeiten der Bauphase A Mitte finden unmittelbar im Anschluss an die Bauphase A Süd statt.

Bauabschnitt B (ca. 21. Oktober bis Anfang November)

Der Kreuzungsbereich Barmbeker Straße / Maria-Louisen-Straße wird in zwei Teilabschnitten saniert:

Bauphase B Süd (Montag, 21.10.24 bis einschl. Montag, 28.10.24)

Die Fahrbahnen im südlichen Kreuzungsbereich Barmbeker Straße / Maria-Louisen-Straße werden saniert.
Der südliche Kreuzungsarm Maria-Louisen-Straße wird gesperrt.
Im nördlichen Kreuzungsarm Maria-Louisen-Straße bleiben die Abbiegebeziehungen rechts in die Kreuzung hinein und rechts aus der Kreuzung heraus offen.

Bauphase B Nord (Montag, 28.10.24 bis einschl. Freitag, 01.11.24)

Die Fahrbahnen im nördlichen Kreuzungsbereich Barmbeker Straße / Maria-Louisen-Straße werden saniert. Der nördliche Kreuzungsarm Maria-Louisen-Straße wird gesperrt. Im südlichen Kreuzungsarm Maria-Louisen-Straße bleiben die Abbiegebeziehungen rechts in die Kreuzung hinein und rechts aus der Kreuzung heraus offen. Die Arbeiten der Bauphase B Nord finden unmittelbar im Anschluss an die Bauphase B Süd statt.

Bauabschnitt C (Ende Juli bis Mitte August)

Die Fahrbahnen von östlich Maria-Louisen-Straße bis einschließlich der Kreuzung Barmbeker Straße / Wiesendamm / Krohnskamp wird in drei Teilabschnitten saniert:

Bauphase C Nord (Montag, 29.07.24 bis einschl. Freitag, 02.08.24)

Die zwei nördlichen Fahrstreifen werden saniert. Die Einmündung Wiesendamm wird gesperrt. Im Kreuzungsarm Krohnskamp bleiben die Abbiegebeziehungen rechts in die Kreuzung hinein und rechts aus der Kreuzung heraus offen.

Bauphase C Süd (Freitag, 02.08.24 bis einschl. Freitag, 09.08.24)

Die zwei südlichen Fahrstreifen werden saniert. Die Einmündungen Gottschedestraße und Krohnskamp werden gesperrt. Im nördlichen Kreuzungsarm Wiesendamm bleiben die Abbiegebeziehungen rechts in die Kreuzung hinein und rechts aus der Kreuzung heraus offen. Die Arbeiten der Bauphase C Süd finden unmittelbar im Anschluss an die Bauphase C Nord statt.

Bauphase C Mitte (Freitag, 09.08.24 bis einschl. Donnerstag, 15.08.24)

Die Fahrbahnen in der Mitte der Barmbeker Straße werden saniert. Die Arbeiten der Bauphase C Mitte finden unmittelbar im Anschluss an die Bauphase C Süd statt.

Bauabschnitt D (Mitte August bis Anfang September)

Die Fahrbahnen von östlich der Kreuzung Barmbeker Straße / Wiesendamm / Krohnskamp bis Barmbeker Straßenbrücke (Goldbekkanal) wird in drei Teilabschnitten saniert:

Bauphase D Süd (Freitag, 16.08.24 bis einschl. Freitag, 23.08.24)

Die zwei südlichen Fahrstreifen werden saniert. Die Einmündung Poßmoorweg wird gesperrt. Im Kreuzungsarm Borgweg bleiben die Abbiegebeziehungen rechts in die Kreuzung hinein und rechts aus der Kreuzung heraus offen.

Bauphase D Nord (Freitag, 23.08.24 bis einschl. Freitag, 30.08.24)

Die zwei südlichen Fahrstreifen werden saniert. Der nördliche Kreuzungsarm Borgweg wird gesperrt. Im Kreuzungsarm Poßmoorweg bleiben die Abbiegebeziehungen rechts in die Kreuzung hinein und rechts aus der Kreuzung heraus offen. Die Arbeiten der Bauphase D Nord finden unmittelbar im Anschluss an die Bauphase D Süd statt.

Bauphase D Mitte (Freitag, 30.08.24 bis einschl. Donnerstag, 05.09.24)

Die Fahrbahnen in der Mitte der Barmbeker Straße werden saniert.

In den Kreuzungsarmen Borgweg und Poßmoorweg bleiben die Abbiegebeziehungen rechts in die Kreuzung hinein und rechts aus der Kreuzung heraus offen.

Die Arbeiten der Bauphase D Mitte finden unmittelbar im Anschluss an die Bauphase D Nord statt.

Bauabschnitt X (Ende Juli bis Mitte Oktober)

Die Bushaltestellen Maria-Louisen-Straße (Nord) werden erneuert. Während dieser Arbeiten wird der Verkehr auf der Barmbeker Straße zeitweise um einen Fahrstreifen pro Fahrtrichtung eingeschränkt. Dem Fuß- und Radverkehr werden Alternativen im Baufeld zur Verfügung gestellt, es wird aber um Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten.

Allgemein

Die Zufahrten zu den Grundstücken der Anlieger*innen bleiben grundsätzlich erhalten, es kann aber zu Einschränkungen kommen. Für den Fall wird es direkte Absprachen mit der örtlichen Bauüberwachung und der Baufirma geben.

Fußgänger*innen und Radfahrer*innen können die Geh- und Radwege grundsätzlich weiterhin nutzen. Es kommt abschnittsweise zu Einschränkungen. Dem Fuß- und Radverkehr werden Alternativen im Baufeld zur Verfügung gestellt, es wird aber um Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten.

Die **Bushaltestellen** im Baufeld werden zeitweise verlegt. Wir bitten Sie, auf die Aushänge an den regulären Bushaltestellen zu achten. Nutzen Sie alternativ bitte die Fahrplanauskunft des HVV online unter hvv.de oder in der HVV-App. Es wird rechtzeitig auf Änderungen im Busbetrieb hingewiesen.

Bei Baumaßnahmen dieser Art lassen sich Einschränkungen für Anlieger:innen sowie für Wegennutzer:innen leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma alles daran setzen, einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Sie haben Rückfragen oder möchten weitere Informationen erhalten?

Bitte wenden Sie sich an:

lsbgkommunikation@lsbg.hamburg.de

Aktuelle Informationen zu dieser und weiteren Baumaßnahmen des LSBG erhalten Sie auf der Internetseite <https://lsbg.hamburg.de/downloads/anliegerinformationen>

Aktuelle Informationen zu Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet erhalten Sie auf der Internetseite www.hamburg.de/baustellen
